



INFORME  
PINTURA CELDAS DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA  
BANCOLOMBIA DIRECCIÓN GENERAL  
2021

# PROYECTO: STREETBOND

---

PROYECTO: PINTURA CELDAS DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA

OBRA EJECUTADA POR: IMPERMEABILIZADOS Y REVESTIMIENTOS CONSOLIDADOS S.A.S. (IRC).

MEDELLIN, ANTIOQUIA.



# INFORMACIÓN GENERAL



- Ubicación: Parquaderos Bancolombia Dirección General
- Cantidad de celdas: 24
- Se identifican celdas en asfalto y en concreto.

# SITUACIÓN ENCONTRADA



# SITUACIÓN ENCONTRADA



Se identifica lesiones de tipo físicas con características erosivas como oquedades. Las celdas presentan discontinuidades como grietas y fisuras.



# ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Se utilizan métodos mecánicos para pulir la superficie y crear un puente de adherencia entre el sustrato y el sistema a aplicar .





# REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS



En las celdas de asfalto se aplicó un mortero de reparación para mejorar la superficie.

Se sellan las discontinuidades encontradas con un adhesivo epóxico de alta resistencia y penetración profunda en grietas en concreto estructural.






# APLICACIÓN DE IMPRIMANTE



Se realiza la aplicación del imprimante Epoxy Primer para mejorar la adherencia del impermeabilizante y sellar la porosidad del sustrato.

# APLICACIÓN DE STREETBOND

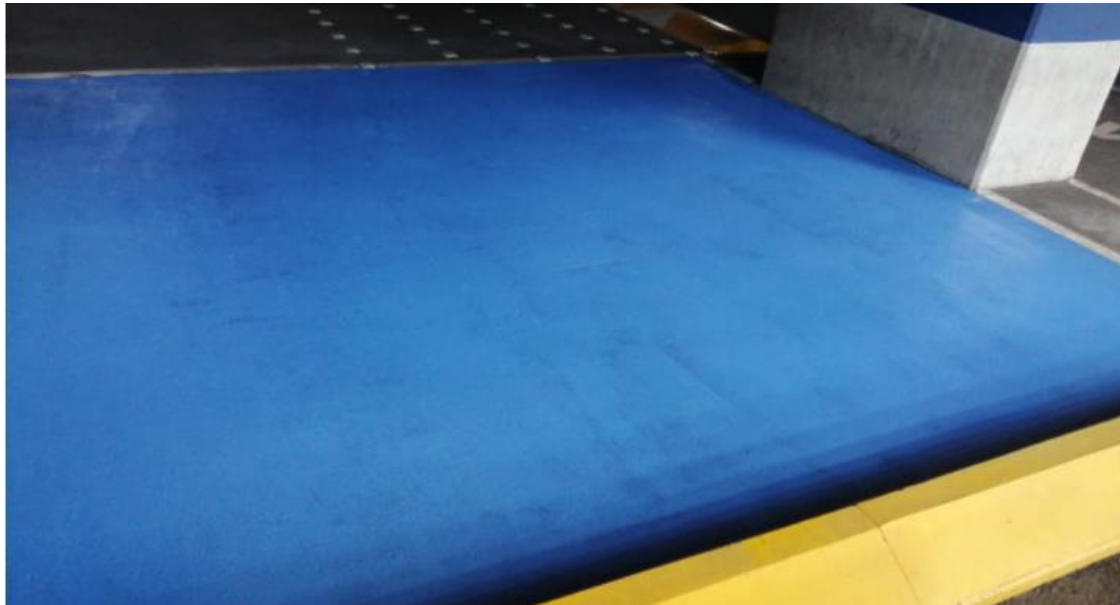

Se aplica revestimiento acrílico epóxico base agua con agregado de sílice seleccionado.





# DEMARCACIÓN LOGO



# RESULTADO FINAL



# CELDAS DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA



ANTES



DESPUÉS

# CELDAS DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA



ANTES



DESPUÉS

# CELDAS DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA





# CELDAS DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA

